



la seguridad es de todos

Míndefensa



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Cartagena, 16/07/2019
No. 30201900227 MD-DIMAR-SUBDEMAR-CIOH-ARAP

Favor referirse a este número al responder

ANH



Al contestar cite Radicador: 20192210251092 Id: 416321
Folios: 4 Fecha: 2019-07-19 13:11:49
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR - GERMAN AUGUSTO ESCOBAR OLAYA
Destinatario: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO

Doctor
CARLOS ALBERTO REY GONZALES
Supervisor Contrato 407 ANH-DIMAR
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Calle 26 No. 59-65 Piso 2
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO 407-2019 ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH Y LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

En mi calidad de supervisor por parte de DIMAR del contrato 407-2019 DIMAR-ANH, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2019, en el marco de la ejecución del contrato.

A partir del pasado mes de junio se dio inicio a la fase de ejecución, a través de la cual se efectuará la adquisición y procesamiento de datos batimétricos en el área de estudio, equivalente a 16.531,45 km² (Ver Figura No. 1)

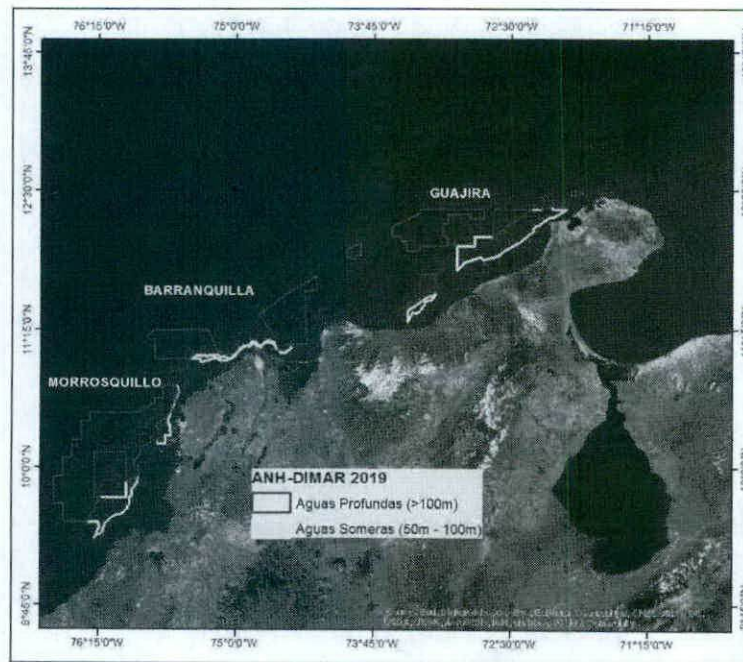


Figura 1. Área de estudio contrato 407-DIMAR-ANH 2019, 16.531,45 km².

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección Escuela Naval Almirante Padilla, Cartagena
Teléfono (095) 6694297, Línea Anticorrupción 01 8000 911 670
Línea gratuita de Atención al Ciudadano: Nacional 01800 115 966 – Bogotá 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

A2-00-FOR-015-V0

Identificador: 7kmG OoHU L/hL B/12 pPut g/O4 O+0=
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesenlinea>

Documento firmado digitalmente



la seguridad
es de todos

Mindefensa



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Durante la primera campaña los trabajos se adelantaron en el polígono Morrosquillo aguas profundas. El consolidado de avance de ejecución del proyecto en el presente periodo refleja una distancia lineal recorrida de 2.100 millas náuticas lineales, con lo cual se ha cubierto un área total de 6.255,1 kilómetros cuadrados de levantamiento batimétrico multihaz, que representan un 37.8% con respecto de los 16.531,45 km² del total del área de trabajo. En la primera campaña no fueron adquiridos datos de Sub Bottom Profiler SBP. (Ver Tabla I).

Tabla I. Cuadro de Situación Actual Kilómetros Levantados

FASE DE EJECUCIÓN					
CAMPAÑAS	DISTANCIA RECORRIDA (MNL)	ÁREA ESPERADA (KM ²)	ÁREA CUBIERTA (KM ²)	PORCENTAJE AVANCE ESPERADO	PORCENTAJE AVANCE REAL
1ra Campaña	2100	6255,1	6255,1	37.8 %	37.8 %
2da Campaña		3870,26			
3ra Campaña		2898,03			
4ta Campaña		1392,57			
5ta Campaña		2115,49			

La figura 2 muestra la cobertura de 6255.1 km² en el área asignada para la presente campaña dentro del polígono Morrosquillo Profundas del área de estudio.

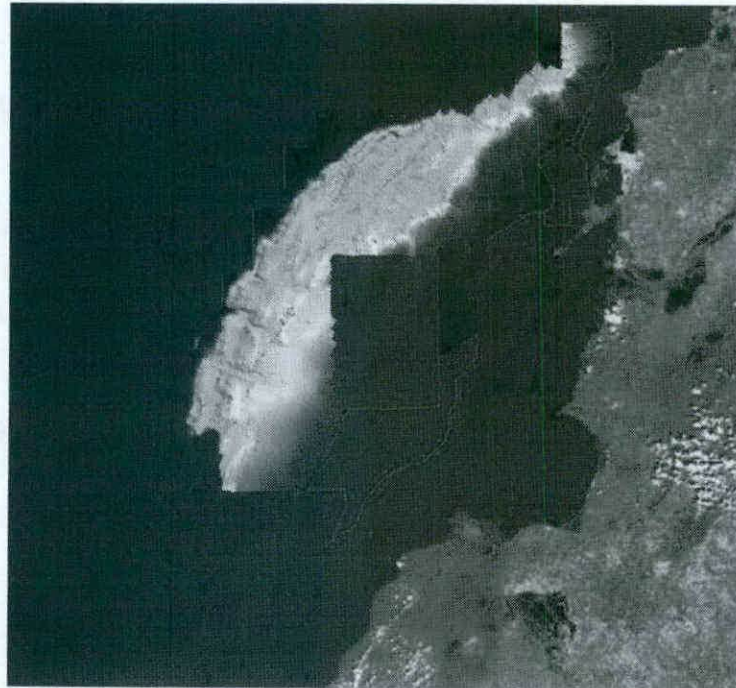


Figura 2. Área cubierta en el presente periodo 6255.1 Km² del Polígono Morrosquillo Profundas

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección Escuela Naval Almirante Padilla, Cartagena

Teléfono (095) 6694297. Línea Anticorrupción 01 8000 911 670

Línea gratuita de Atención al Ciudadano: Nacional 01800 115 966 – Bogotá 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

A2-00-FOR-015-V0





la seguridad
es de todos

Mindefensa



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

En la tabla II, se presenta el avance general de las actividades contempladas en el contrato 407-DIMAR-ANH 2019.

Tabla II. Cuadro de Situación Actual de Actividades del Contrato.

FASE ALISTAMIENTO					
NRO.	ACTIVIDAD	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	AVANCE
1	Elaboración de Contrato	30 días	mie 01/05/19	vie 31/05/19	100%
2	Firma de contrato	1 días	vie 31/05/19	vie 31/05/19	100%
3	Adecuación de puestos de trabajo y compra de equipos	17 días	mie 01/05/19	sab 18/05/19	100%
4	Capacitación, Prueba y Calibración de equipos	20 días	mie 01/05/19	mar 21/05/19	100%
5	Alistamiento y abastecimiento de buques	10 días	mar 21/05/19	vie 31/05/19	100%
FASE EJECUCIÓN					
NRO.	ACTIVIDAD	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	AVANCE
6	Primera campaña de levantamiento hidrográfico	29 días	sab 01/06/19	dom 30/06/19	100%
7	Procesamiento de datos hidrográficos 1ª Campaña	36 días	jue 30/06/19	lun 05/08/19	20%
8	Segunda campaña de levantamiento hidrográfico	16 días	lun 01/07/19	mie 17/07/19	0%
9	Procesamiento de datos hidrográficos 2ª Campaña	25 días	mie 17/07/19	dom 11/08/19	0%
10	Tercera campaña de levantamiento hidrográfico	14 días	jue 01/08/19	jue 15/08/09	0%
11	Procesamiento de datos hidrográficos 3ª Campaña	20 días	jue 15/08/19	mie 04/09/19	0%
12	Cuarta campaña de levantamiento Hidrográfico	39 días	lun 01/07/19	vie 09/08/19	0%
13	Procesamiento de datos hidrográficos 4ª Campaña	45 días	vie 09/08/19	lun 23/09/19	0%
14	Quinta campaña de levantamiento hidrográfico	58 días	lun 12/08/19	mie 09/10/19	0%
15	Procesamiento de datos hidrográficos 5ª Campaña	60 días	mie 09/10/19	dom 08/12/19	0%

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección Escuela Naval Almirante Padilla, Cartagena

Teléfono (095) 6694297. Línea Anticorrupción 01 8000 911 670

Línea gratuita de Atención al Ciudadano: Nacional 01800 115 966 – Bogotá 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

A2-00-FOR-015-V0



OBSERVACIONES

Las condiciones meteomarinas reinantes en el área del levantamiento estuvieron estables, permitiendo el normal desarrollo del levantamiento.

Atentamente,

Capitán de Navío **GERMAN AUGUSTO ESCOBAR OLAYA**
Director Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe
Supervisor Contrato DIMAR

Anexo: Un (1) CD con archivos Digitales en formato GeoTIFF, Csar, XYZ y parte de la data cruda de la información levantada.



Identificador: 7kmG OqHU L/hL BU12 pPui g/O4 O+0=
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a <https://servicios.dimar.mil.co/SE-tramitesonline>
