

	INSTRUCTIVO MANUAL DE USUARIO	Versión 1
		Fecha de emisión: 13/03/2018
	PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE	Página 1 de 15

MANUAL DE USUARIO:

**“PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE- PROGRAMA DE TRABAJOS DE
EXPLOTACION”**

[2021/07/14]
Bogotá, Colombia

	INSTRUCTIVO MANUAL DE USUARIO	Versión 1
		Fecha de emisión: 13/03/2018
	PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE	Página 2 de 15

INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

Código del Documento	MAN04	Versión Actual del Documento	1
Descripción General:	En este documento se describe el proceso que se debe realizar para presentar el informe de Ejecución PTE Semestre I, desde el aplicativo.		

REVISIONES Y APROBACIONES

Acción	Rol	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado por:	Analista de requerimientos	Nelson Raúl Olvera Peña	Contratista – Oficina Tecnologías de la Información	
Revisado por:	Arquitecto de software	Daniel José Romero Martínez	Contratista – Oficina Tecnologías de la Información	
Aprobado por:	Aprobador	Martha Lucia Torres Giraldo	Jefe Oficina Tecnologías de la Información	

Fecha	Versión	Descripción	Elaboró	
2021/07/14	1	Creación documento	Nelson Raúl Olvera Peña	

HISTORIAL DE VERSIONES

	INSTRUCTIVO MANUAL DE USUARIO	Versión 1
		Fecha de emisión: 13/03/2018
	PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE	Página 3 de 15

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el instructivo funcional, bajo el cual las empresas operadoras podrán realizar el cargue de datos y presentación del Informe de Ejecución PTE Semestre I, cuando así lo requieran, y se cumplan las condiciones para hacerlo.

Pre-requisitos para ingresar al sistema

Para ingresar al sistema de cargue y presentación de Informes de Ejecución PTE Semestre I, se requiere tener el nombre de usuario y contraseña asignado a la empresa.

Conexión a internet e ingresar mediante un navegador (Google Chrome , Internet Explorer)


Nota: Los datos que se usan a continuación son únicamente de ejemplo, no son reales y solo servirán como referencia ilustrativa para el paso a paso de este manual de usuario.

1. Ingresar al Sistema mediante el siguiente enlace:
<https://sschoperadoras.anh.gov.co/#/login>

El usuario debe loguearse con el usuario y contraseña asignados.


	INSTRUCTIVO MANUAL DE USUARIO	Versión 1
		Fecha de emisión: 13/03/2018
	PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE	Página 4 de 15

- Se presenta un resumen preliminar del estado de los informes, se debe seleccionar la opción: **INGRESAR** en la sección de **EJECUCION DEL PTE/PAO**:

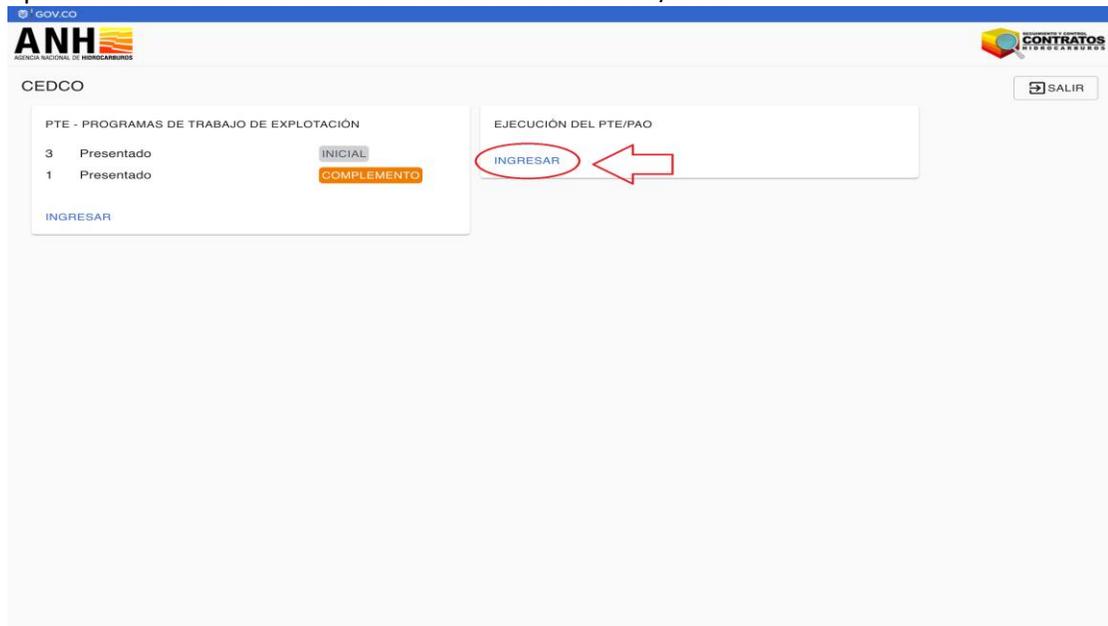

The screenshot shows the ANH web portal. At the top, there is a blue header with the ANH logo and the text 'AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS'. Below the header, there is a navigation bar with 'CEDCO' and 'CONTRATOS' options. The main content area is divided into two sections: 'PTE - PROGRAMAS DE TRABAJO DE EXPLOTACIÓN' and 'EJECUCIÓN DEL PTE/PAO'. In the 'PTE' section, there are two rows of data: '3 Presentado' with 'INICIAL' and '1 Presentado' with 'COMPLEMENTO'. In the 'EJECUCIÓN DEL PTE/PAO' section, there is a red circle around the 'INGRESAR' button, with a red arrow pointing to it from the right.


- Se debe seleccionar el Contrato y opción **CONSULTAR**:

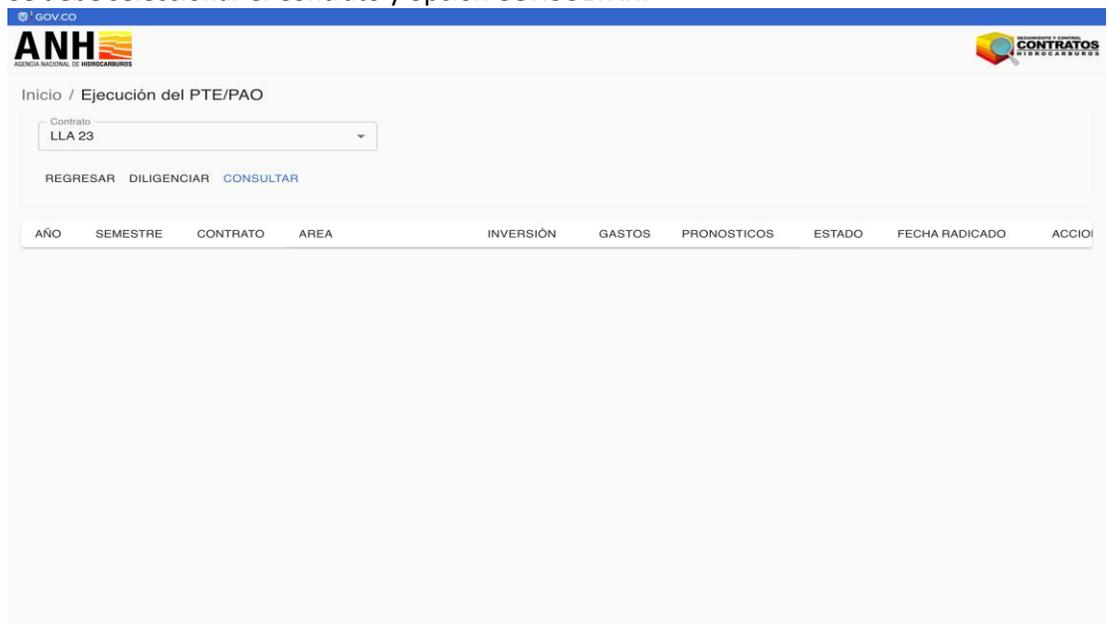

The screenshot shows the ANH web portal. At the top, there is a blue header with the ANH logo and the text 'AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS'. Below the header, there is a navigation bar with 'CONTRATOS' and 'SALIR' options. The main content area is titled 'Inicio / Ejecución del PTE/PAO'. There is a dropdown menu for 'Contrato' with 'LLA 23' selected. Below the dropdown, there are three buttons: 'REGRESAR', 'DILIGENCIAR', and 'CONSULTAR'. The 'CONSULTAR' button is highlighted in blue. At the bottom, there is a table with columns: 'AÑO', 'SEMESTRE', 'CONTRATO', 'AREA', 'INVERSIÓN', 'GASTOS', 'PRONOSTICOS', 'ESTADO', 'FECHA RADICADO', and 'ACCIOI'.

	INSTRUCTIVO MANUAL DE USUARIO	Versión 1
		Fecha de emisión: 13/03/2018
PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE		Página 5 de 15

4. Se debe seleccionar el Contrato y opción DILIGENCIAR:

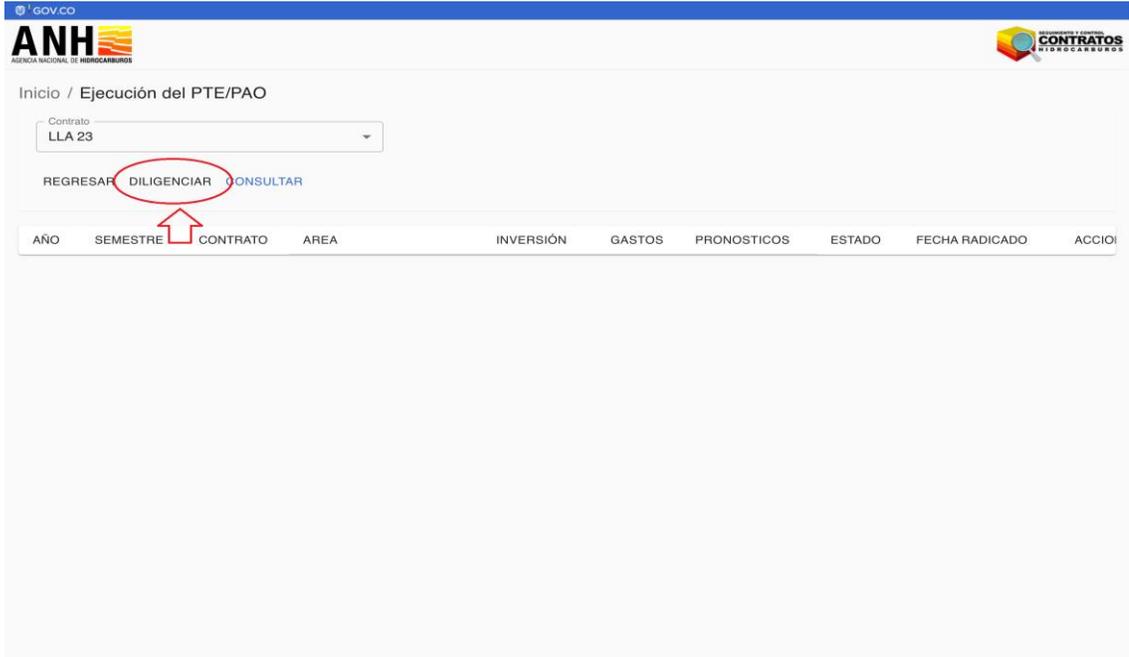

gov.co

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATOS
HIDROCARBUROS


Inicio / Ejecución del PTE/PAO

Contrato
LLA 23

REGRESAR **DILIGENCIAR** CONSULTAR

AÑO	SEMESTRE	CONTRATO	AREA	INVERSIÓN	GASTOS	PRONOSTICOS	ESTADO	FECHA RADICADO	ACCIOI
-----	----------	----------	------	-----------	--------	-------------	--------	----------------	--------

5. Selecciona el Área, si no existe creado el informe, el sistema solicita confirmar por medio de una ventana emergente, se debe hacer Click en CREAR INFORME:



gov.co

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATOS
HIDROCARBUROS

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato
LLA 23

Area
Labrador


Vigencia
Operación

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR **GUARDAR**

No existe un Informe creado para el contrato y area seleccionado. Desea crearlo?

CANCELAR **CREAR INFORME**

6. Se debe continuar seleccionando de la lista desplegable de la Vigencia: Primer Semestre 2021, la Operación y Click en CONSULTAR:



Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador


Vigencia: Primer Semestre 2021 Operación: [Desplegada]

REGRESAR AGREGAR FILA **CONSULTAR** GUARDAR

Operación desplegada:

1. Inversión: Cronograma de actividades y presupuesto estimado
2. Gastos: Cronograma de actividades y presupuesto estimado
3. Pronóstico de producción

7. El sistema carga las actividades que se presentaron en el Informe PTE en los trimestres I y II, se deben diligenciar los campos de lo Ejecutado en el Trimestre I y II:

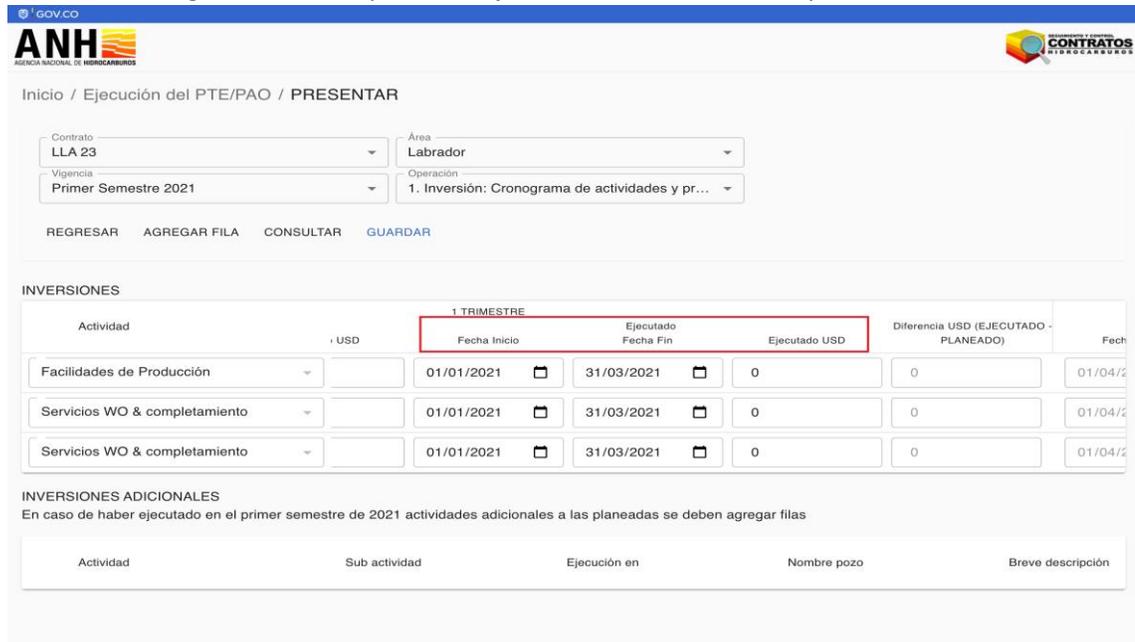

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador

Vigencia: Primer Semestre 2021 Operación: 1. Inversión: Cronograma de actividades y pr...

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR GUARDAR

INVERSIONES

Actividad	USD	1 TRIMESTRE			Diferencia USD (EJECUTADO - PLANEADO)	Fecha
		Fecha Inicio	Ejecutado Fecha Fin	Ejecutado USD		
Facilidades de Producción		01/01/2021	31/03/2021	0	0	01/04/2021
Servicios WO & completamiento		01/01/2021	31/03/2021	0	0	01/04/2021
Servicios WO & completamiento		01/01/2021	31/03/2021	0	0	01/04/2021

INVERSIONES ADICIONALES
En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Sub actividad	Ejecución en	Nombre pozo	Breve descripción
-----------	---------------	--------------	-------------	-------------------

gov.co

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS



Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: Área:
 Vigencia: Operación:

[REGRESAR](#) [AGREGAR FILA](#) [CONSULTAR](#) [GUARDAR](#)

INVERSIONES

Actividad	Planeado USD	Ejecutado USD	Total Semestre I Diferencia USD	Explicar Diferencias	Observaciones
Facilidades de Producción	159.407	0	-159.407		
Servicios WO & completamiento	660.582	0	-660.582		
Servicios WO & completamiento	467.130	0	-467.130		

INVERSIONES ADICIONALES
En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Sub actividad	Ejecución en	Nombre pozo	Breve descripción
-----------	---------------	--------------	-------------	-------------------

8. En caso de requerir agregar más actividades, Click en AGREGAR FILA:

gov.co

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS



Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: Área:
 Vigencia: Operación:

[REGRESAR](#) [AGREGAR FILA](#) [CONSULTAR](#) [GUARDAR](#)


INVERSIONES

Actividad	Planeado USD	Ejecutado USD	Total Semestre I Diferencia USD	Explicar Diferencias	Observaciones
Facilidades de Producción	159.407	159.407	0	Replanteamie...	observación 1
Servicios WO & completamiento	660.582	600.000	-60.582	Replanteamie...	observación 2
Servicios WO & completamiento	467.130	467.000	-130	Optimización d...	observación 3

INVERSIONES ADICIONALES
En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Sub actividad	Ejecución en	Nombre pozo	Breve descripción
-----------	---------------	--------------	-------------	-------------------

9. Ingresar los datos de la Actividad a agregar y Click en CONFIRMAR:

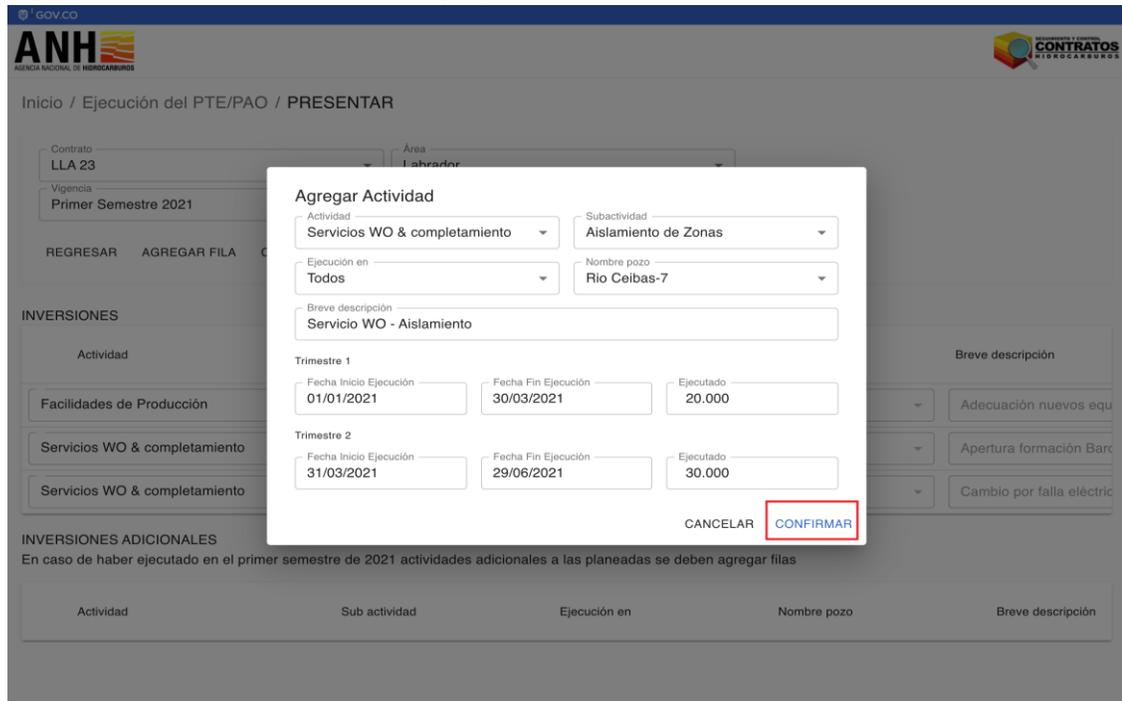

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 | Área: Labrador

Vigencia: Primer Semestre 2021

REGRESAR AGREGAR FILA

INVERSIONES

Actividad

Facilidades de Producción

Servicios WO & completamiento


Servicios WO & completamiento

INVERSIONES ADICIONALES

En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad Sub actividad Ejecución en Nombre pozo Breve descripción

10. El Sistema muestra la actividad agregada en la parte inferior:

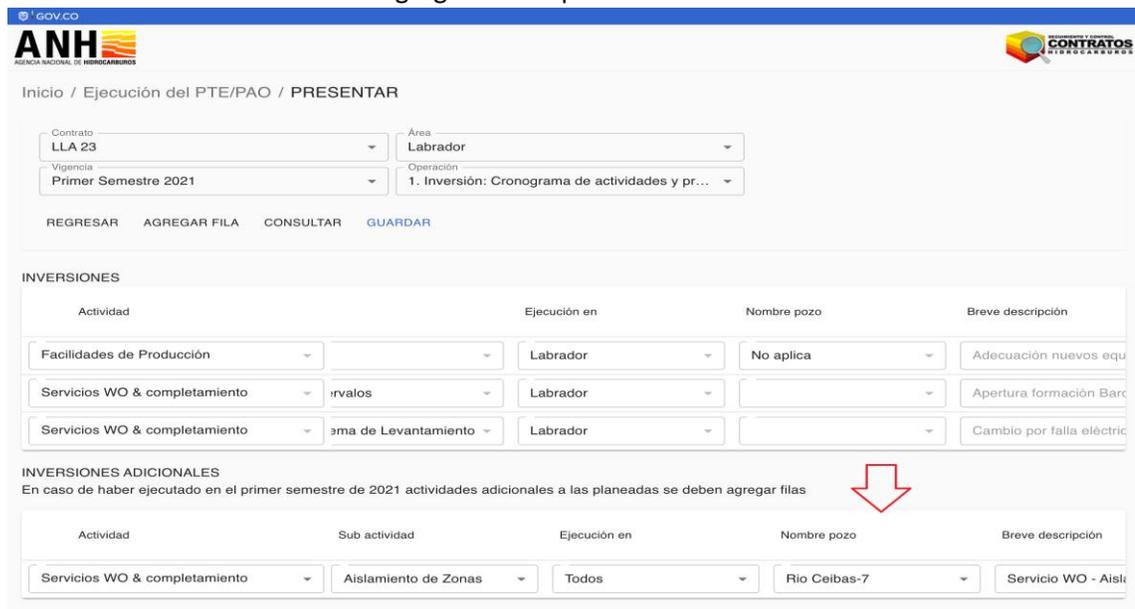

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 | Área: Labrador

Vigencia: Primer Semestre 2021 | Operación: 1. Inversión: Cronograma de actividades y pr...

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR GUARDAR

INVERSIONES


Actividad	Ejecución en	Nombre pozo	Breve descripción
Facilidades de Producción	Labrador	No aplica	Adecuación nuevos equ
Servicios WO & completamiento	Labrador		Apertura formación Bar
Servicios WO & completamiento	Labrador		Cambio por falla eléctric

INVERSIONES ADICIONALES

En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Sub actividad	Ejecución en	Nombre pozo	Breve descripción
Servicios WO & completamiento	Aislamiento de Zonas	Todos	Rio Ceibas-7	Servicio WO - Aisl

11. Una vez se realice el diligenciamiento de la Operación Inversión se debe hacer Click en **GUARDAR**:

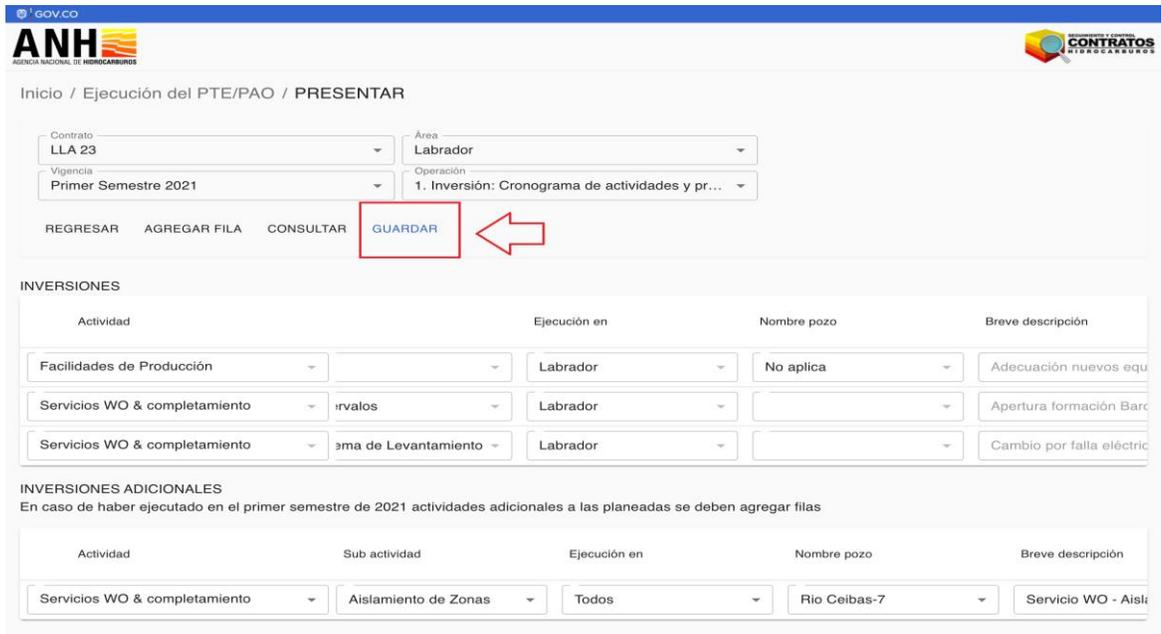

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 Operación: 1. Inversión: Cronograma de actividades y pr...

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR **GUARDAR**

Actividad	Ejecución en	Nombre pozo	Breve descripción
Facilidades de Producción	Labrador	No aplica	Adecuación nuevos equ
Servicios WO & completamiento	Labrador		Apertura formación Barc
Servicios WO & completamiento	Labrador		Cambio por falla eléctric

INVERSIONES ADICIONALES
En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Sub actividad	Ejecución en	Nombre pozo	Breve descripción
Servicios WO & completamiento	Aislamiento de Zonas	Todos	Rio Ceibas-7	Servicio WO - Aisl

12. Se debe seleccionar la operación Gastos y Click en **CONSULTAR**:



Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 Operación: 2. Gastos: Cronograma de actividades y pres...

REGRESAR AGREGAR FILA **CONSULTAR** GUARDAR


Gastos

Actividad	Ejecución en	Breve descripción	Tipo costo	Fecha Inicio
-----------	--------------	-------------------	------------	--------------

GASTOS ADICIONALES
En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Ejecución en	Breve descripción	Tipo costo	Fecha Inicio
-----------	--------------	-------------------	------------	--------------

13. Se deben diligenciar los datos de lo ejecutado en la operación Gastos, si se requiere agregar Actividad, se debe hacer Click en AGREGAR FILA:

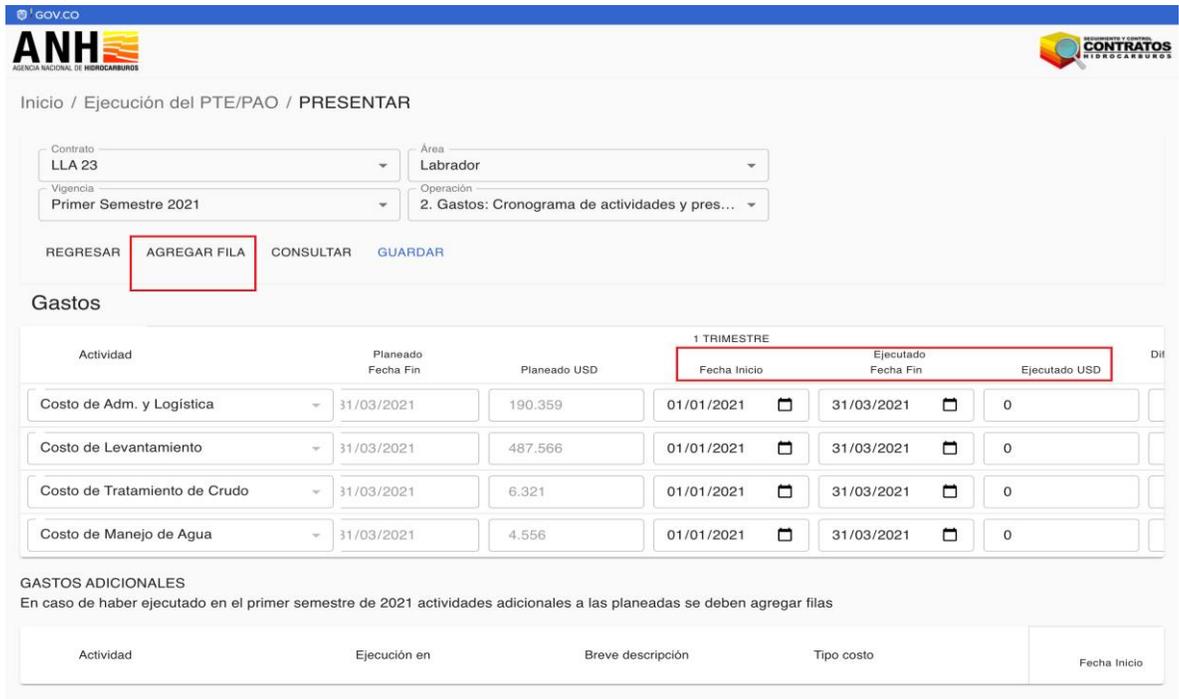

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador

Vigencia: Primer Semestre 2021 Operación: 2. Gastos: Cronograma de actividades y pres...

REGRESAR **AGREGAR FILA** CONSULTAR GUARDAR


Gastos

Actividad	Planeado Fecha Fin	Planeado USD	1 TRIMESTRE		
			Fecha Inicio	Ejecutado Fecha Fin	Ejecutado USD
Costo de Adm. y Logística	31/03/2021	190.359	01/01/2021	31/03/2021	0
Costo de Levantamiento	31/03/2021	487.566	01/01/2021	31/03/2021	0
Costo de Tratamiento de Crudo	31/03/2021	6.321	01/01/2021	31/03/2021	0
Costo de Manejo de Agua	31/03/2021	4.556	01/01/2021	31/03/2021	0

GASTOS ADICIONALES
En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Ejecución en	Breve descripción	Tipo costo	Fecha Inicio
-----------	--------------	-------------------	------------	--------------

14. Se diligencian los datos de la Actividad agregada y Click en CONFIRMAR:

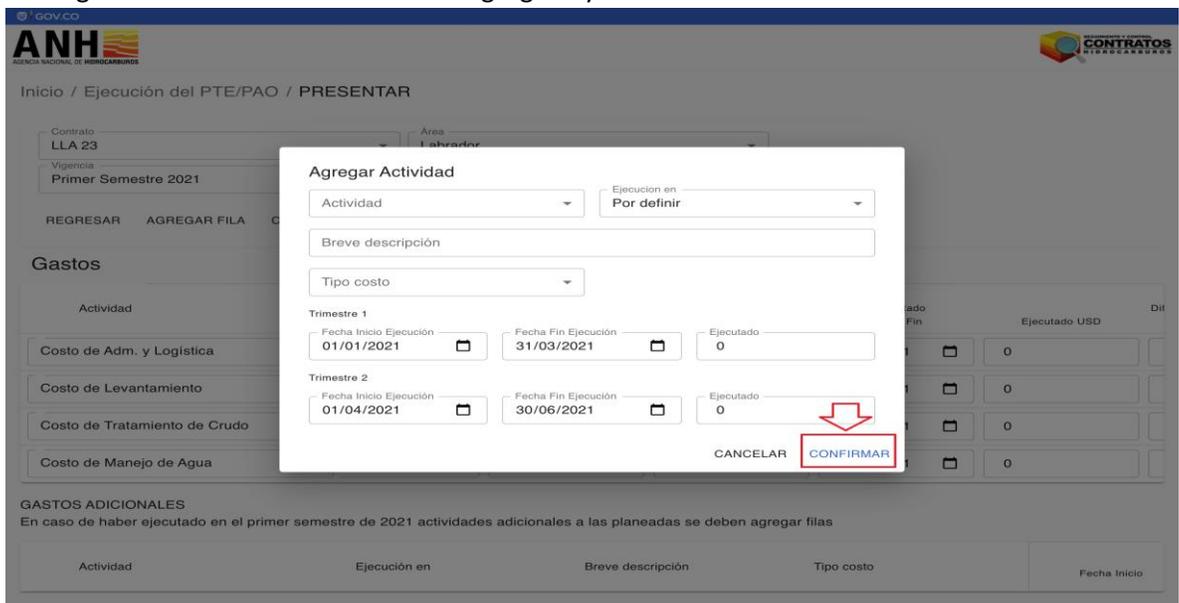

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador

Vigencia: Primer Semestre 2021

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR GUARDAR

Gastos

Actividad	Planeado Fecha Fin	Planeado USD	1 TRIMESTRE Fecha Inicio	1 TRIMESTRE Ejecutado Fecha Fin	1 TRIMESTRE Ejecutado USD
Costo de Adm. y Logística	31/03/2021	190.359	01/01/2021	31/03/2021	0
Costo de Levantamiento	31/03/2021	487.566	01/01/2021	31/03/2021	0
Costo de Tratamiento de Crudo	31/03/2021	6.321	01/01/2021	31/03/2021	0
Costo de Manejo de Agua	31/03/2021	4.556	01/01/2021	31/03/2021	0

Agregar Actividad

Actividad: Ejecución en:

Breve descripción:

Tipo costo:


Trimestre 1
 Fecha Inicio Ejecución: Fecha Fin Ejecución: Ejecutado:

Trimestre 2
 Fecha Inicio Ejecución: Fecha Fin Ejecución: Ejecutado:

GASTOS ADICIONALES
En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Ejecución en	Breve descripción	Tipo costo	Fecha Inicio
-----------	--------------	-------------------	------------	--------------

15. Una vez se hayan diligenciado los datos de lo ejecutado en la operación Gastos, se debe hacer Click en GUARDAR:

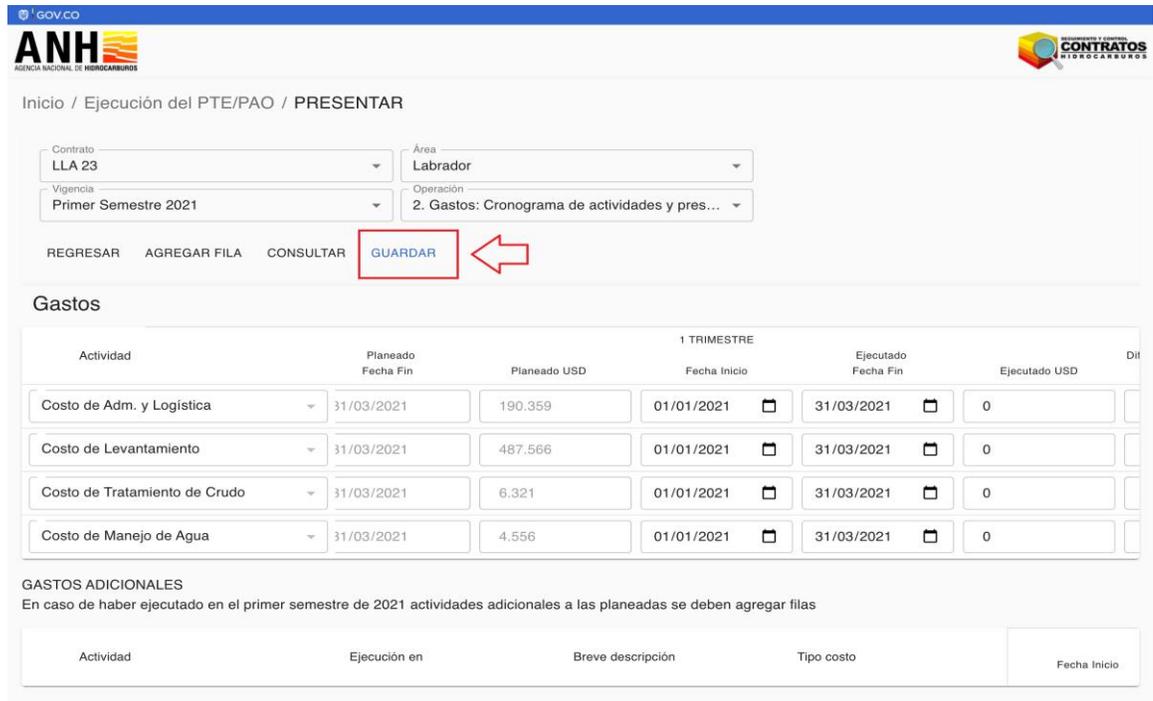

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 Operación: 2. Gastos: Cronograma de actividades y pres...

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR **GUARDAR**


Gastos

Actividad	Planeado Fecha Fin	Planeado USD	1 TRIMESTRE		Ejecutado Fecha Fin	Ejecutado USD	Dif
			Fecha Inicio				
Costo de Adm. y Logística	31/03/2021	190.359	01/01/2021		31/03/2021	0	
Costo de Levantamiento	31/03/2021	487.566	01/01/2021		31/03/2021	0	
Costo de Tratamiento de Crudo	31/03/2021	6.321	01/01/2021		31/03/2021	0	
Costo de Manejo de Agua	31/03/2021	4.556	01/01/2021		31/03/2021	0	

GASTOS ADICIONALES
 En caso de haber ejecutado en el primer semestre de 2021 actividades adicionales a las planeadas se deben agregar filas

Actividad	Ejecución en	Breve descripción	Tipo costo	Fecha Inicio
-----------	--------------	-------------------	------------	--------------

16. Se debe seleccionar la operación Pronósticos y Click en CONSULTAR:

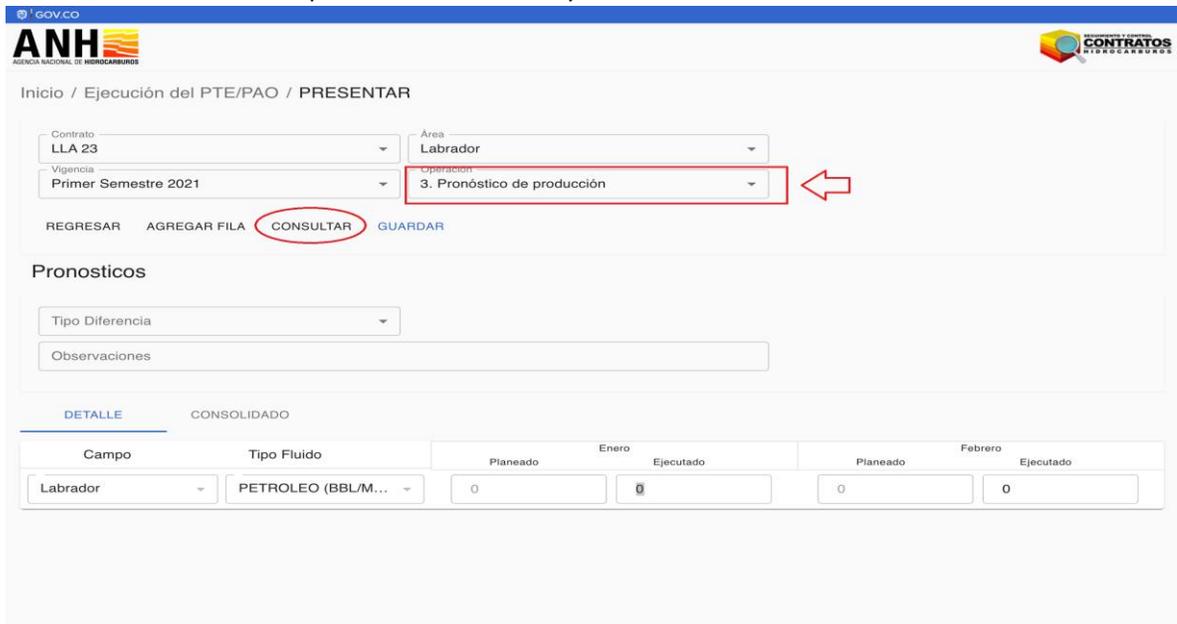

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 Operación: 3. Pronóstico de producción

REGRESAR AGREGAR FILA **CONSULTAR** GUARDAR

Pronósticos


Tipo Diferencia:

Observaciones:

DETALLE CONSOLIDADO

Campo	Tipo Fluido	Enero		Febrero	
		Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado
Labrador	PETROLEO (BBL/M...	0	0	0	0

17. Se deben diligenciar los campos de lo ejecutado:

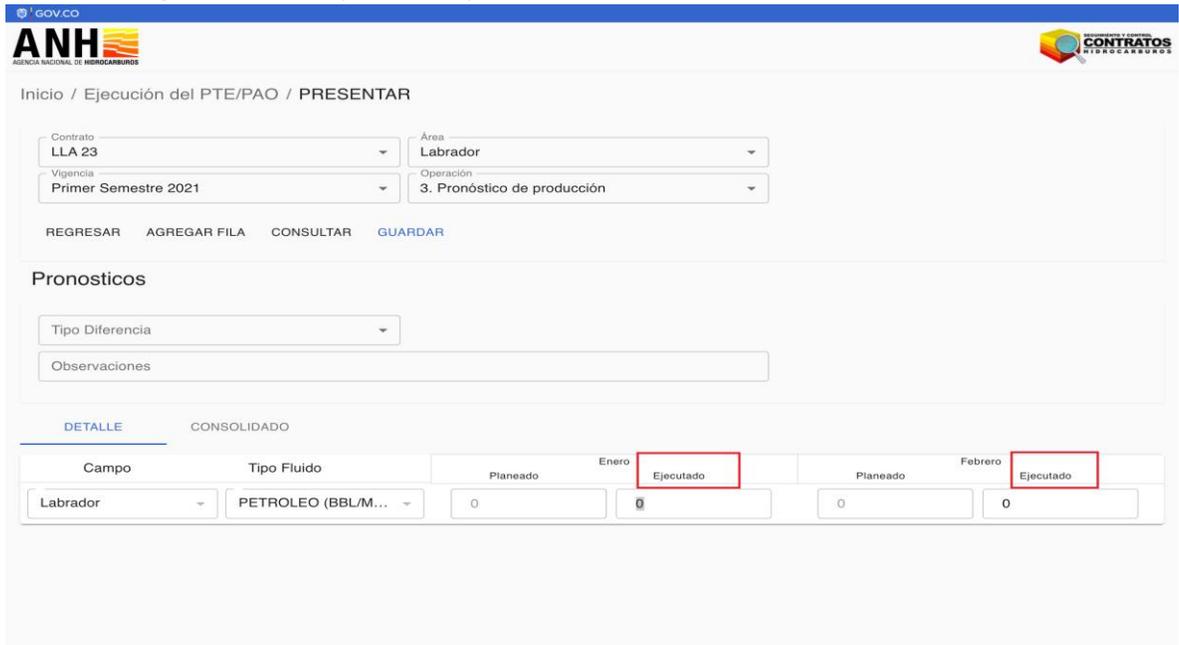

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 | Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 | Operación: 3. Pronóstico de producción

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR **GUARDAR**


Pronosticos

Tipo Diferencia: []
Observaciones: []

DETALLE CONSOLIDADO

Campo	Tipo Fluido	Planeado	Enero	Ejecutado	Planeado	Febrero	Ejecutado
Labrador	PETROLEO (BBL/M...	0	0	0	0	0	0

18. Una vez se hayan diligenciado los campos de lo ejecutado se debe hacer Click en CONSOLIDADO:

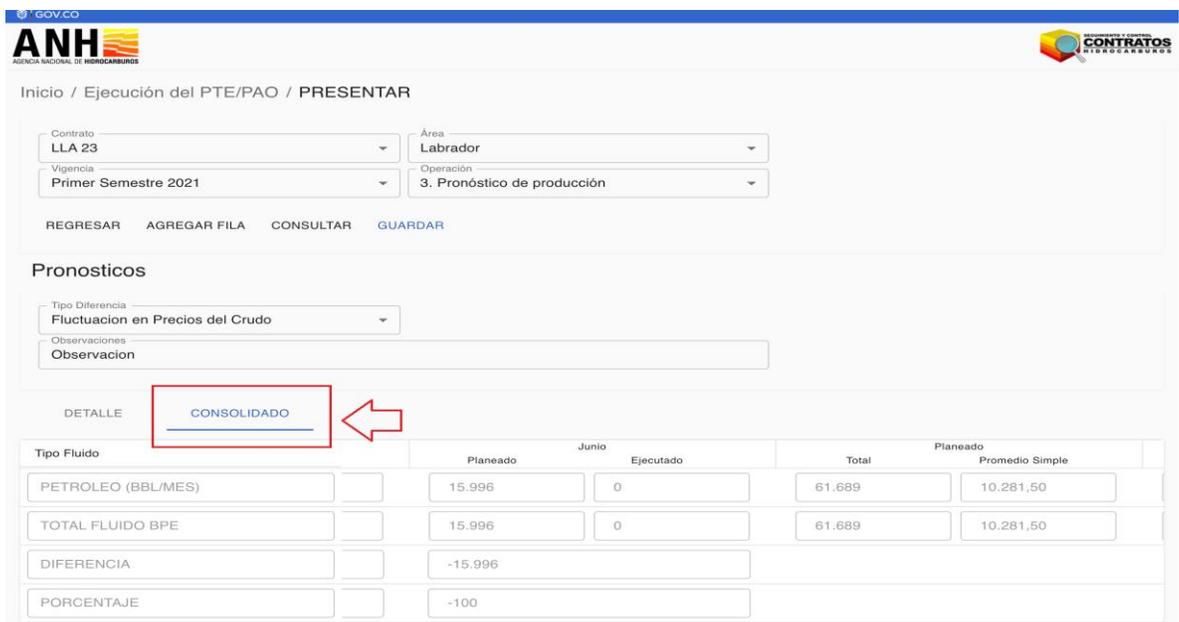

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 | Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 | Operación: 3. Pronóstico de producción

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR **GUARDAR**


Pronosticos

Tipo Diferencia: Fluctuación en Precios del Crudo
Observaciones: Observacion

DETALLE **CONSOLIDADO** ←

Tipo Fluido	Planeado	Junio	Ejecutado	Total	Planeado	Promedio Simple
PETROLEO (BBL/MES)	15.996	0	0	61.689	10.281,50	
TOTAL FLUIDO BPE	15.996	0	0	61.689	10.281,50	
DIFERENCIA	-15.996					
PORCENTAJE	-100					

19. Se debe seleccionar el Tipo de Diferencia, ingresar las observaciones y Click en GUARDAR:

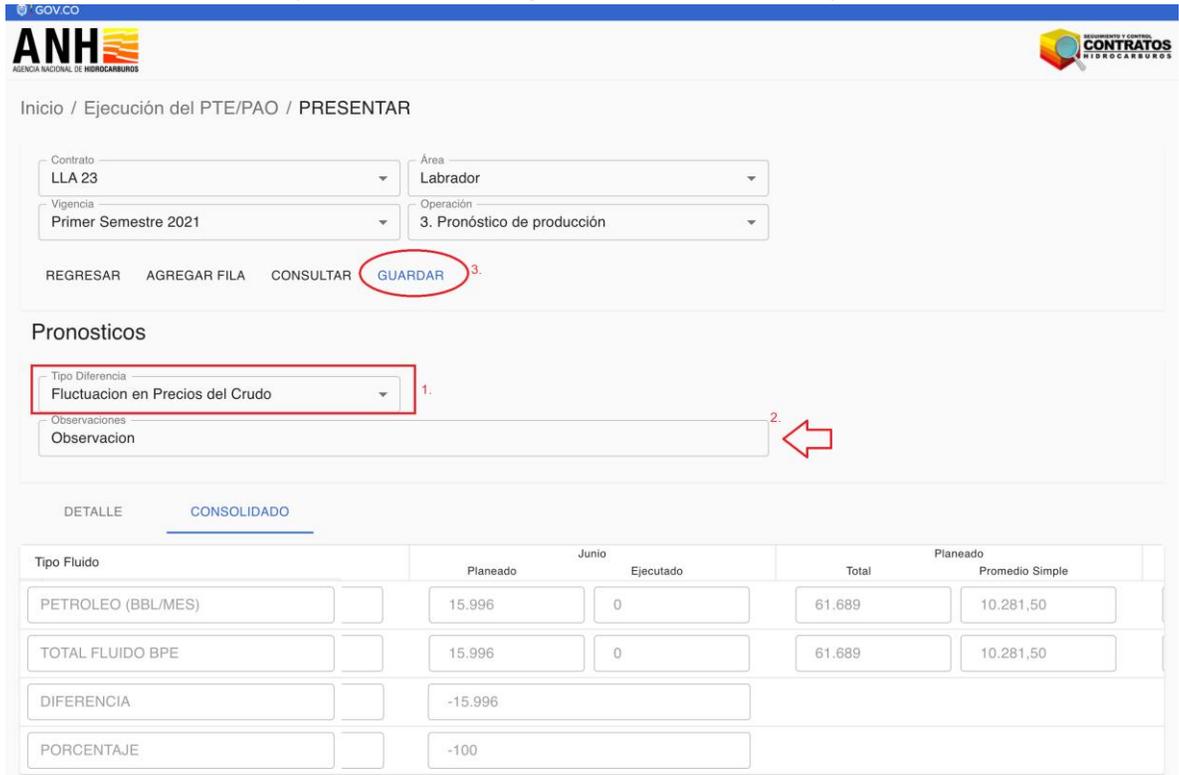

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 | Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 | Operación: 3. Pronóstico de producción

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR **GUARDAR**^{3.}


Pronosticos

Tipo Diferencia: Fluctuacion en Precios del Crudo^{1.}
 Observaciones: Observacion^{2.}

DETALLE CONSOLIDADO

Tipo Fluido	Planeado	Junio	Ejecutado	Total	Planeado	Promedio Simple
PETROLEO (BBL/MES)	15.996		0	61.689		10.281,50
TOTAL FLUIDO BPE	15.996		0	61.689		10.281,50
DIFERENCIA	-15.996					
PORCENTAJE	-100					

20. Una vez guardado, se debe hacer Click en REGRESAR:

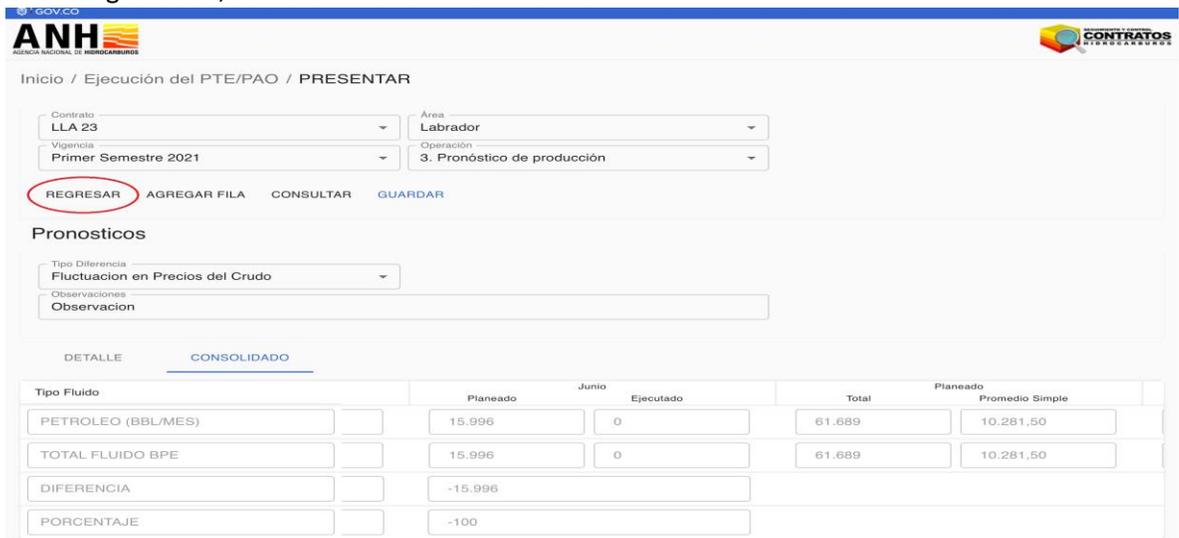

Inicio / Ejecución del PTE/PAO / PRESENTAR

Contrato: LLA 23 | Área: Labrador
 Vigencia: Primer Semestre 2021 | Operación: 3. Pronóstico de producción

REGRESAR AGREGAR FILA CONSULTAR GUARDAR

Pronosticos


Tipo Diferencia: Fluctuacion en Precios del Crudo
 Observaciones: Observacion

DETALLE CONSOLIDADO

Tipo Fluido	Planeado	Junio	Ejecutado	Total	Planeado	Promedio Simple
PETROLEO (BBL/MES)	15.996		0	61.689		10.281,50
TOTAL FLUIDO BPE	15.996		0	61.689		10.281,50
DIFERENCIA	-15.996					
PORCENTAJE	-100					

	INSTRUCTIVO MANUAL DE USUARIO	Versión 1
		Fecha de emisión: 13/03/2018
PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE		Página 14 de 15

21. El Sistema presenta en pantalla el estado de las Operaciones diligenciadas, con un visto verde las operaciones, por área diligenciadas, y en rojo las que nos están diligenciadas, y estado Borrador del Informe:

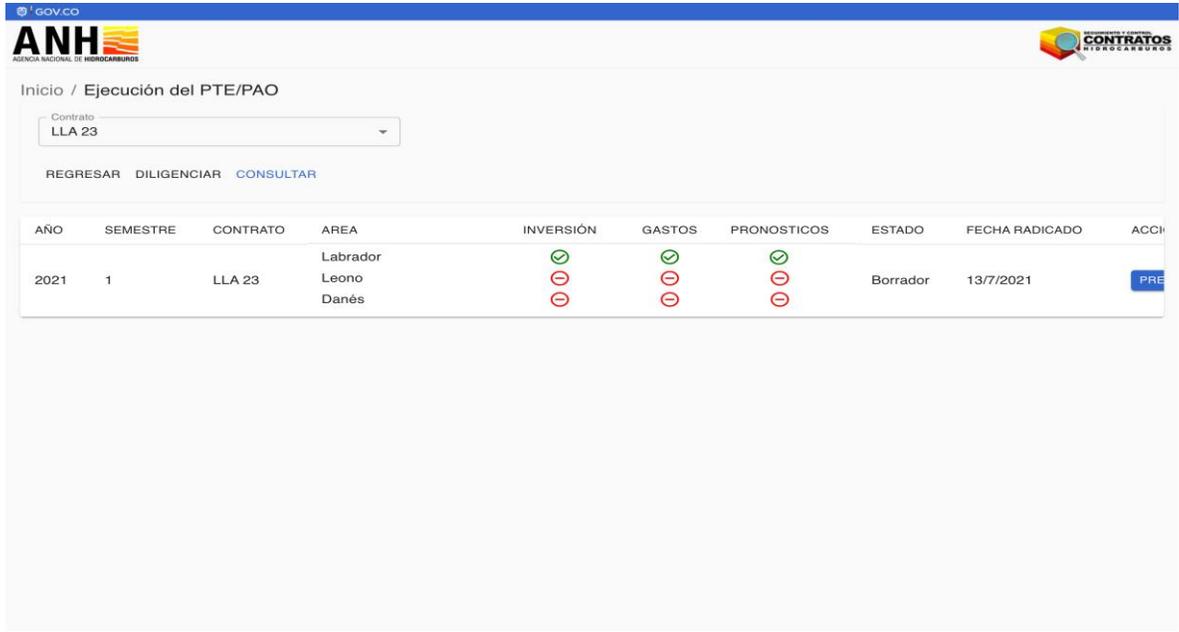


Inicio / Ejecución del PTE/PAO

Contrato: LLA 23

REGRESAR DILIGENCIAR CONSULTAR

AÑO	SEMESTRE	CONTRATO	AREA	INVERSIÓN	GASTOS	PRONOSTICOS	ESTADO	FECHA RADICADO	ACCH
2021	1	LLA 23	Labrador	✓	✓	✓	Borrador	13/7/2021	PRE
			Leono	⊖	⊖	⊖			
			Danés	⊖	⊖	⊖			

22. Una vez se diligencien todas las Operaciones (Inversiones, Gastos y Pronósticos) desde Acciones se debe hacer Click en PRESENTAR:

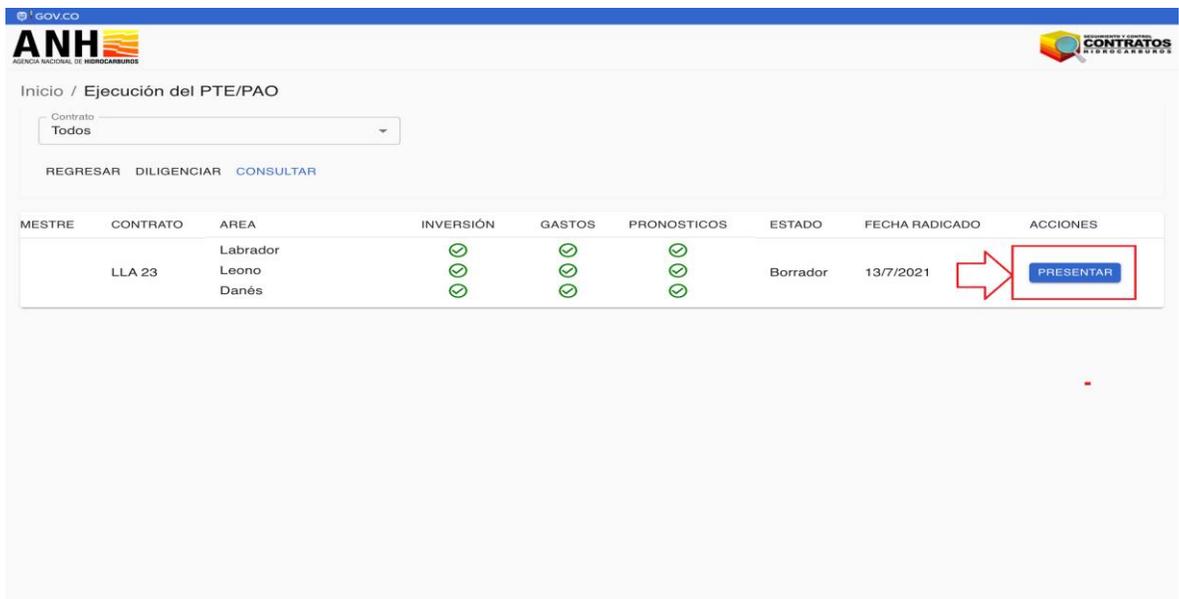

Inicio / Ejecución del PTE/PAO


Contrato: Todos

REGRESAR DILIGENCIAR CONSULTAR

MESTRE	CONTRATO	AREA	INVERSIÓN	GASTOS	PRONOSTICOS	ESTADO	FECHA RADICADO	ACCIONES
	LLA 23	Labrador	✓	✓	✓	Borrador	13/7/2021	PRESENTAR
		Leono	✓	✓	✓			
		Danés	✓	✓	✓			

	INSTRUCTIVO MANUAL DE USUARIO	Versión 1
		Fecha de emisión: 13/03/2018
	PRESENTAR INFORME EJECUCION PTE	Página 15 de 15

23. Se carga la comunicación remisoría, Click en PRESENTAR, y el informe queda presentado y enviado a la ANH:




PRESENTAR INFORME

Para presentar el informe de ejecución PTE/PAO semestre 1, debe adjuntar la comunicación remisoría:

Comunicación remisoría
 No file chosen

24. El estado del Informe cambia a Presentado:

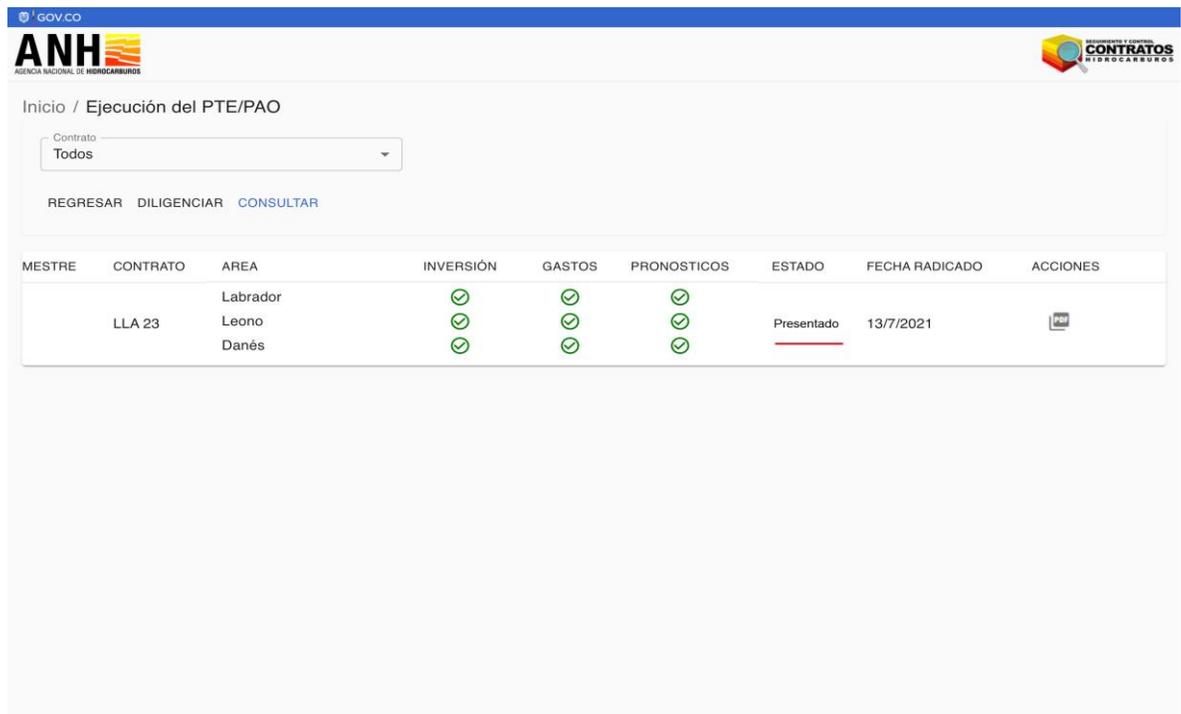

ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Inicio / Ejecución del PTE/PAO

Contrato: Todos

REGRESAR DILIGENCIAR CONSULTAR

MESTRE	CONTRATO	AREA	INVERSIÓN	GASTOS	PRONOSTICOS	ESTADO	FECHA RADICADO	ACCIONES
	LLA 23	Labrador	✔	✔	✔	Presentado	13/7/2021	
		Leono	✔	✔	✔			
		Danés	✔	✔	✔			
